

# (都)高田若槻線 街路工事

- 工事概要： 令和元年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 (都)高田若槻線 長野市 桐原～吉田(1工区、2工区、3工区、4工区、6工区、7工区、8工区、9工区)
- 工期： 令和元年10月～令和3年3月下旬
- 発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9594(代表:026-233-5151)
- (都)高田若槻線 道路建設安全協議会 (事務局連絡先)：(株)北條組 電話番号 026-245-0574(本社)



## 【工事の進捗状況】

道路延長 L=872m

早期開通に向けてがんばります！

1工区：道路築造工事


2工区：道路築造工事

(1工区：無散水消雪工)

9工区：無散水消雪工

(2工区：無散水消雪工)

6工区：電気通信工事



桐原  
交差点

長野吉田高校東  
交差点

2020.9.9現在

3工区：さく井工事 井戸設置 ■

8工区：無散水消雪工

7工区：大型案内標識工事 ◆

4工区：排水設備工事 ●

## 【空撮写真】


長野電鉄線から南側へ



長野吉田高校東交差点から南側へ



## 【標準横断面図（アンダーパス部）】

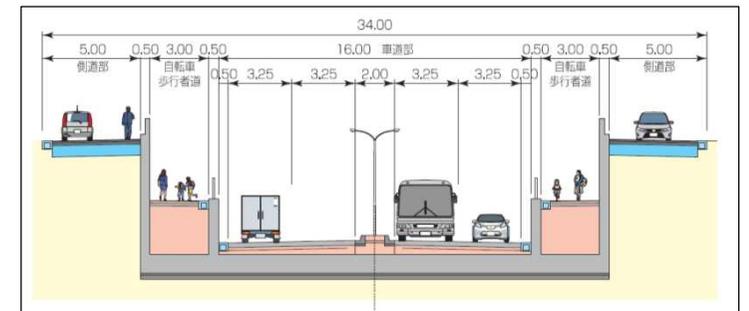

# 【各工区の工事紹介】 早期開通に向かって前向きに進んでいます\_(.\_)\_! ?



<p>1工区(南側): (株)北條組 現場代理人: 滝沢 豊 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=9,684m<sup>2</sup> 側溝工 L=1,919m ほか</p>  <p>写真: 起点から北を望む</p> <p>現在、側溝工ほか施工中! ・9月1日より市道195号線の構造物関係施工中、また9月下旬より北長野通り交差点付近の構造物の施工を行う予定です。 ご不便等をお掛けしますが宜しくお願い致します。</p>	<p>2工区(北側): (株)塩川組 現場代理人: 牧島 吉宣 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=6,655m<sup>2</sup> 側溝工 L=1,469m ほか</p>  <p>写真: 終点から南を望む</p> <p>現在、アンダーパス側道部で舗装工ほか 施工中!</p>	<p>3工区: (株)日さく 現場代理人: 会津 隆士 主な工事内容 さく井工(井戸掘り) N=3箇所</p>  <p>写真: 井戸から出る湧水</p> <p>現在、3箇所目井戸掘り準備中! ・写真は、掘削完了後の井戸で実施した揚水試験の状況です。 3箇所目の井戸は、10月中旬の掘削開始を予定しております。ご迷惑お掛けすることもありますが、ご協力いただきますよう、お願いいたします。</p>	<p>4工区: (株)日本アフター工業 現場代理人: 渡辺 圭 主な工事内容 排水ポンプ設置工 N=3基 ほか</p>  <p>写真: 基礎コンクリート打設</p> <p>現在、発電設備施工中! ・写真は自家発電機を設置する基礎のコンクリートを打設している状況です。 9月末に自家発電機を設置を予定しております。</p>	<p>5工区: (株)アスペック 現場代理人: 未 定 主な工事内容 転落防止柵工 L=550.0m</p>   <p>写真: 施工箇所</p>
<p>6工区: 矢木コーポレーション(株) 現場代理人: 山田 謙一郎 主な工事内容 道路照明 1式、道路冠水警報設備 1式 防犯設備 1式</p>  <p>写真: 施工箇所</p> <p>現在、照明基礎、照明ハンドホール 施工中! 今後、機器製作に入ります。</p>	<p>7工区: 矢木コーポレーション(株) 現場代理人: 奥野 忠 主な工事内容 大型案内標識設置工 N=8箇所</p>  <p>写真: 大型案内標識基礎</p> <p>現在、標識基礎完了、柱・板製造中!</p>	<p>8工区: 共進建設(株) 現場代理人: 今井 美鈴 主な工事内容 無散水消雪工 1式(右側)</p>  <p>写真: 無散水消雪工(参考写真)</p> <p>現在、施工計画策定中!</p>	<p>9工区: (株)アスペック 現場代理人: 柳沢 和幸 主な工事内容 無散水消雪工 1式(左側)</p>  <p>写真: 施工箇所</p> <p>現在、施工計画策定中!</p>	<p>10工区: 未 定 現場代理人: 未 定 主な工事内容 ＜桐原交差点 舗装工＞ 本線 L=110.3m 市道 L=103.0m ほか</p>   <p>写真: 施工箇所</p>
