

第6回「遠山郷いい川づくり」推進会議

工事の進捗状況について



- ①平成27年度工事の進捗状況
- ②平成28年度工事の予定

①平成27年度工事の進捗状況

◇和田1工区（根固工 工事）

受注者：池端工業（株）

工 期：平成27年11月10日～平成28年3月24日

進捗率：100%（3月22日竣工）

◇和田2工区（盛土工 工事）

受注者：（株）近藤工務店

工 期：平成27年12月8日～平成28年3月30日

進捗率：95%

残工事：河床整理
（3月25日竣工予定）

①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 着工前



①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 床堀完了



遠山川



①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 根固工完成



①平成27年度工事の進捗状況

和田1工区 覆土完成



①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 右岸着工前



①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 右岸完成



①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 左岸着工前



①平成27年度工事の進捗状況

和田2工区 左岸完成



②平成28年度工事の予定

工事箇所 の 優先順位

②流水の分散
流水の安定

人が自由に
近づける施設

自然な河床を
誘導する施設

③護岸の整備

①河床の安定

②水衝部の保護

通路の確保

②平成28年度工事の予定

◇工事箇所：中橋下流右岸側 護岸工

◇発注時期：平成27年10月

施工業者決定後、施工方法が決まった段階で地域住民を対象とした工事説明会を実施。（11月を予定）

◇工事期間：平成27年11月～平成28年3月
（渇水期に施工）


※予算の状況により施工範囲や発注時期が変更となる可能性があります。

②平成28年度工事の予定

【護岸工の設計】 目的：護岸未整備区間の保護

- ・遠山川の景観に合う自然石を使用
⇒練石張工

護岸工断面図

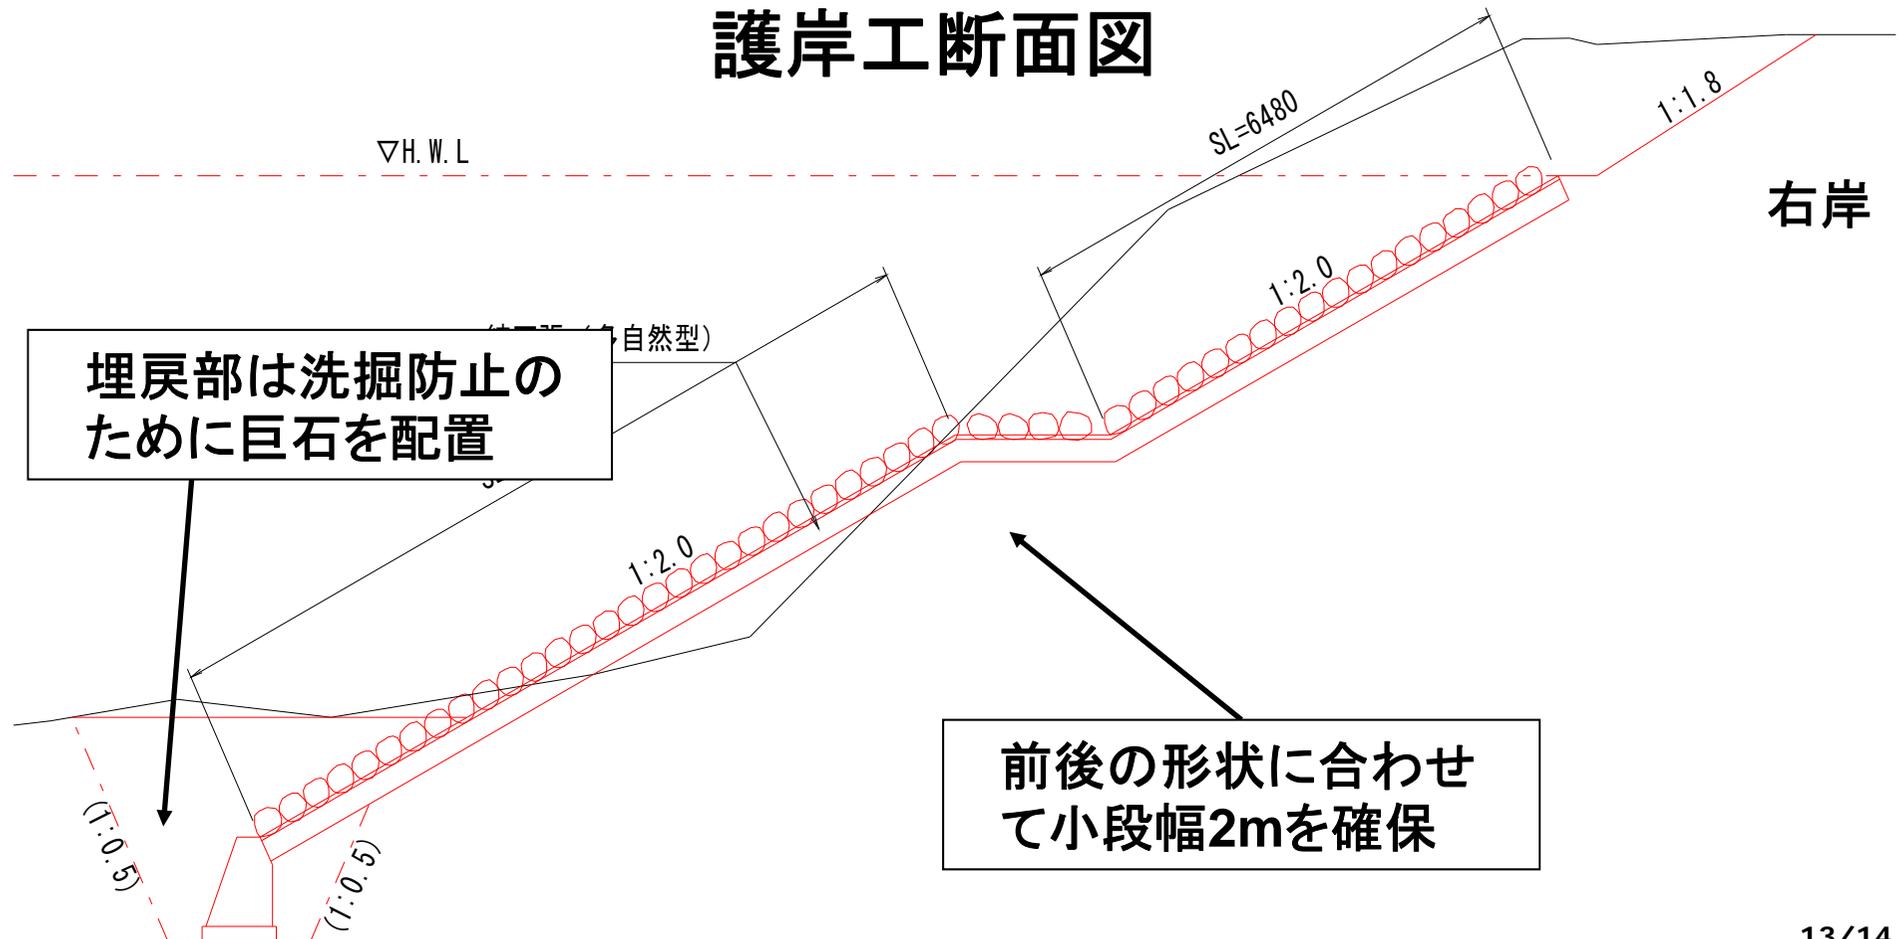

②平成28年度工事の予定

現場研修会の開催

◇日時：平成28年12月～平成28年2月
(工事期間中)

◇場所：中橋下流右岸側 護岸工（練石張工）

◇内容：練石張工における・石の配置方法
・石の連結方法

※推進会議で行う上記見学（研修）会の他、個別に見学を希望はされる方は、随時見学可能ですので、事前に建設事務所までご連絡ください。
