

(都)高田若槻線 街路工事

発行元：(都)高田若槻線 道路建設安全協議会



- 工事概要：令和元年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 (都)高田若槻線 長野市 桐原～吉田(1工区、2工区、3工区、4工区、5工区、6工区、7工区、8工区、9工区、10工区)
- 工期：令和元年10月～令和3年3月下旬
- 発注者：長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9594(代表:026-233-5151)
- (都)高田若槻線 道路建設安全協議会 (事務局連絡先)：(株)北條組 電話番号 026-245-0574(本社)

【工事の進捗状況(1月)】

道路延長 L=872m

今年も無事故無災害で、ゼロ災を達成しよう ヨシ！



【空撮写真】


長野電鉄線から南側へ



長野電鉄線から北側へ



【概略縦断面図】

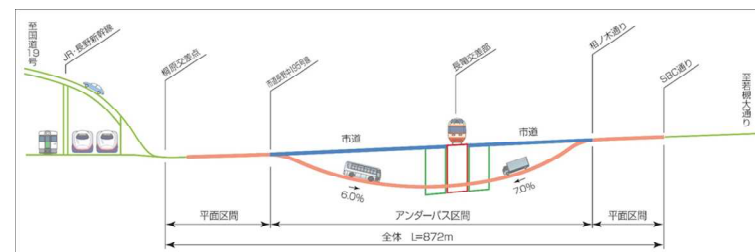

【各工区（1月）の工事紹介】

私たちは、確かなものづくりを通して、豊かな社会の実現に貢献します！



<p>1工区（南側）：(株)北條組 現場代理人：滝沢 豊 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=9,684m² 側溝工 L=1,919m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：市道195号線より北長野通りを望む</p> <p>1月上旬よりアンダーパス内無散水工事及び舗装工事が始まり、降雪等により工期遅れが懸念されますが、頑張っていきますので何卒宜しくお願い致します。</p>	<p>2工区（北側）：(株)塩川組 現場代理人：牧島 吉宣 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=6,655m² 側溝工 L=1,469m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：SBC通りから相ノ木通りを望む</p> <p>現在、本線部で水路・緑石他を施工中です。令和3年1月13日より、本線部の掘削作業を停止して作業します。ご不便をお掛けしますが、皆様方のご理解ご協力をお願いいたします。</p>	<p>3工区：(株)日さく 現場代理人：会津 隆士 主な工事内容 さく井工（井戸掘り）N=3箇所 さく井部ポンプ設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：井戸ポンプ室(ピットレスユニット)作業</p> <p>井戸の設置は、全て完了いたしました。1月から配管・設備工事に着手いたしますので、引き続き、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。</p>	<p>4工区：(株)日本アフター工業 現場代理人：渡辺 圭 主な工事内容 排水ポンプ設置工 N=3基 受電設備設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：電気設備周りフェンス設置</p> <p>写真は電気設備周りのフェンス設置している状況です。残るはポンプ、自家発電機の試運転になります。引き続き、皆様のご理解ご協力をお願い致します。</p>	<p>5工区：(株)アスベック 現場代理人：山崎 博正 主な工事内容 転落防止柵工 L=496.0m 塩カルBOX N=4基</p>  <p>写真：防護柵設置前 全景</p> <p>防護柵を工場製作中 防護柵設置は、1月20日から施工予定宜しくお願い致します</p>
<p>6工区： 矢木コーポレーション(株) 現場代理人： 山田 謙一郎 主な工事内容 道路照明 1式、道路冠水警報設備 1式 防犯設備 1式 ほか</p>  <p>写真：アンダーパス部道路照明</p> <p>現在、交差点関連の基礎工、埋設配管工を施工しています。 機器の製作完了は2月上旬を予定しています。引き続きよろしくお祈りいたします。</p>	<p>7工区： 矢木コーポレーション(株) 現場代理人： 奥野 忠</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">竣工</div> <p>主な工事内容 大型案内標識設置工 N=8箇所 警戒標識設置工 1式</p>  <p>写真：標識設置完了</p> <p>全ての標識を設置完了しました。地元の皆様はじめ各関係者皆様、短い期間でありましたが、大変お世話になりました。</p>	<p>8工区： 共進建設(株) 現場代理人： 今井 美鈴 主な工事内容 無散水消雪工 1式(右側)</p>  <p>写真：無散水消雪工 融雪パイプ施工前</p> <p>1月13日から融雪パイプの施工を開始し、1月中旬に1回目のコンクリート打設を行います。アンダーパス内の作業の際は、作業の音が響いてしまいますが、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。</p>	<p>9工区： (株)アスベック 現場代理人： 柳沢 和幸 主な工事内容 無散水消雪工 1式(左側)</p>  <p>写真：無散水消雪工 融雪パイプ施工前</p> <p>あけましておめでとうございます 1月6日から融雪パイプ作業を開始し1回目の生コン打設を21日に予定します生コン搬入の際は、宜しくお願い致します</p>	<p>10工区： 日本綜合建設(株) 現場代理人： 林田 健治 主な工事内容 ＜桐原交差点 舗装工＞ 本線 L=110.3m 市道 L=103.0m ほか</p>  <p>写真：本線№12付近より施工開始</p> <p>1月5日より施工を開始しました。現在 構造物取壊し、撤去作業中です。 車線規制並びに歩道通行止めのため、通行される皆様にはご不便お掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。</p>
