

中佐都バイパス 工事進捗状況 (5)

(中部横断自動車道 佐久中佐都インターチェンジ アクセス道路整備)


一般県道 塩名田佐久線 佐久市 中佐都地区 (社会資本整備総合交付金事業)

【事業概要】 ○全体計画延長 L=2,143m ○道路幅員 6.5 (12.0) m ○事業期間 平成22年度～

平成22年度から整備を進めております 一般県道塩名田佐久線 佐久市 中佐都バイパス (延長約2.1km) のうち、2期施工区間の、「落合北」交差点～「鳴瀬」交差点間1.1km 区間について、令和2年度中の開通を目指し、現在鋭意工事を進めています。

- ・H30 3工区…道路築造工 L=242m 9月末完了
- ・R1 1工区…浅科側水路工事 9月末頃から着工予定
- 2工区…IC側水路工事 9月末頃から着工予定
- 3工区…浅科側道路築造工事 1、2工区終了後着工予定
- 4工区…IC側道路築造工事 1、2工区終了後着工予定

付近の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

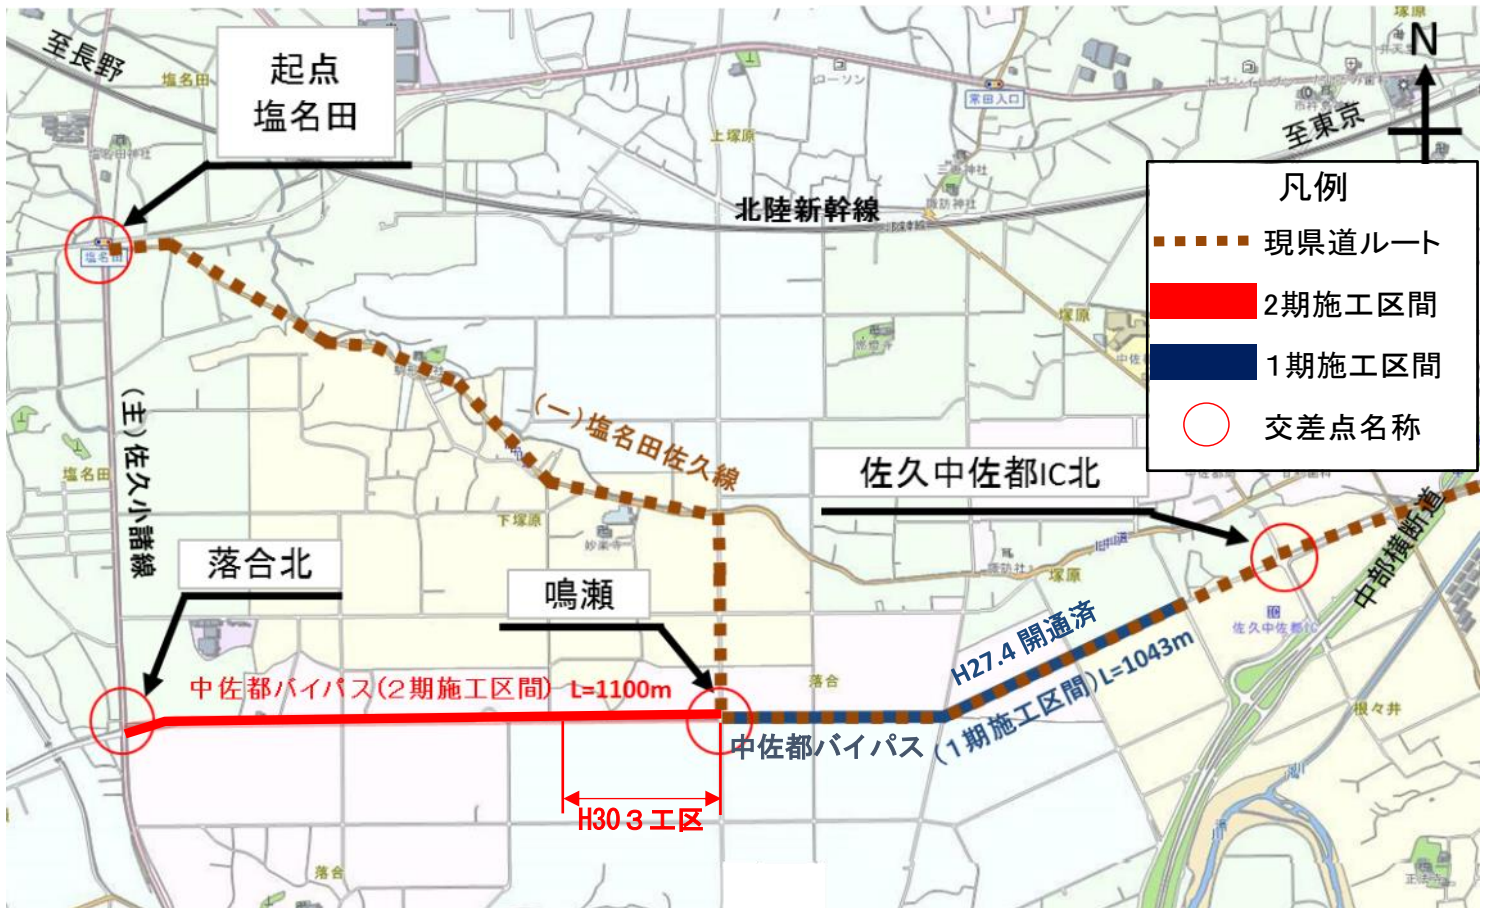

落合北交差点側より
R元年9月25日撮影

至佐久中佐都IC

至浅科

落合北交差点




鳴瀬交差点側より
R元年9月25日撮影

至浅科

至佐久中佐都IC

鳴瀬交差点

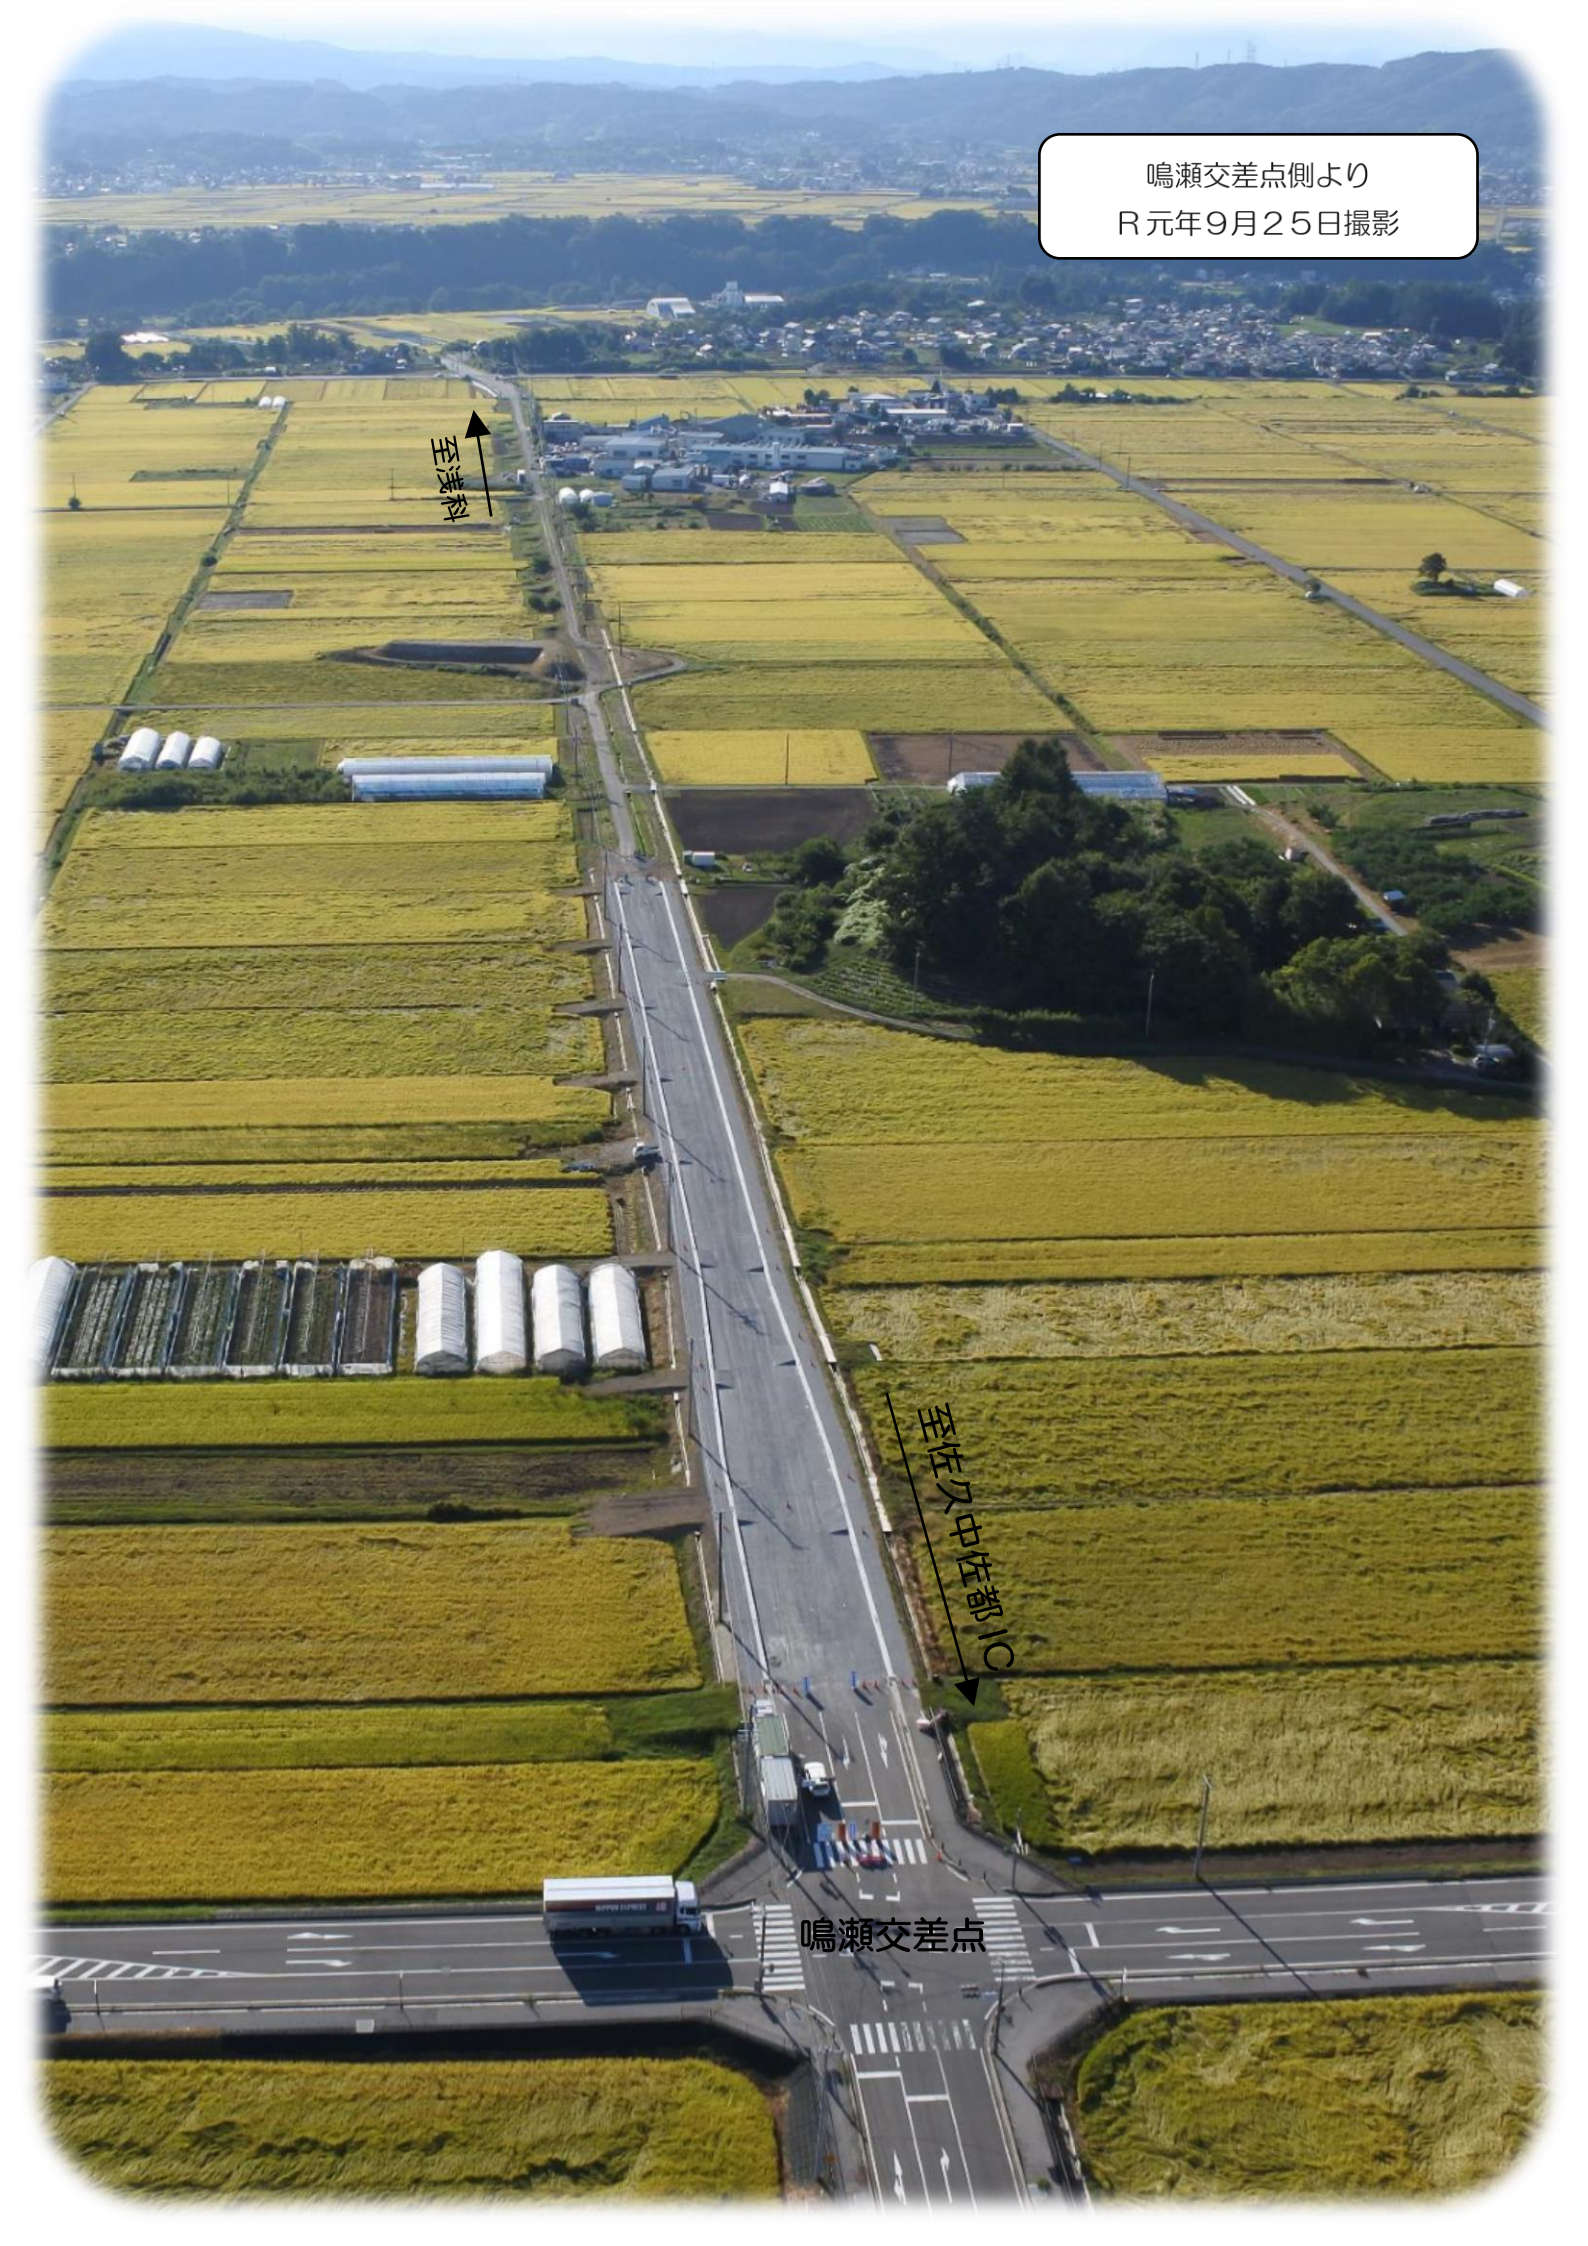

浅蓼大橋工区 工事進捗状況(2)

((国)141号 4車線化工事)


一般国道 141号 佐久市～小諸市 跡部～平原 (社会資本整備総合交付金事業)

【浅蓼大橋工区】○計画延長 L=840(うち橋梁 408)m ○道路幅員 13.0 (25.0) m ○事業期間 平成 26 年度～

平成 26 年度から事業を進めております 一般国道 141号 佐久市～小諸市 跡部～平原のうち、浅蓼大橋の 4 車線化工事を現在鋭意施工中です。



- ・H30 工事……第 2 橋の P2、P3 橋脚及び A2 橋台の嵩上げ工を現在施工中。(R2 年 3 月まで)
- ・R1 工事……第 1 橋の P2(3 工区)、P4(1 工区)、P6(2 工区)橋脚を現在施工中。完了後、P3(4 工区)、P5(5 工区)橋脚を施工予定。

資材搬入出時には、国道が片側交互通行となるため、通行される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

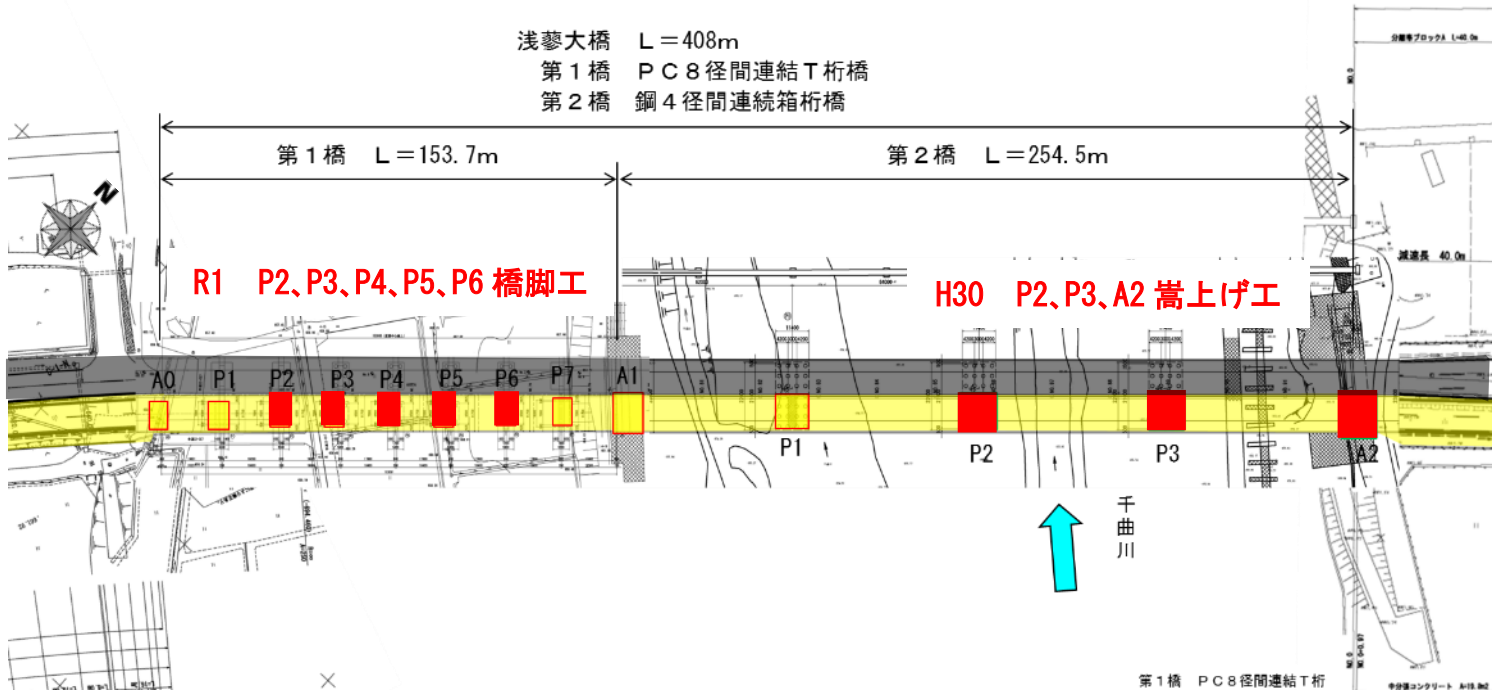

凡例

- 供用済み
- H30, R1 施工箇所
- R2 以降施工箇所
- 下部工箇所

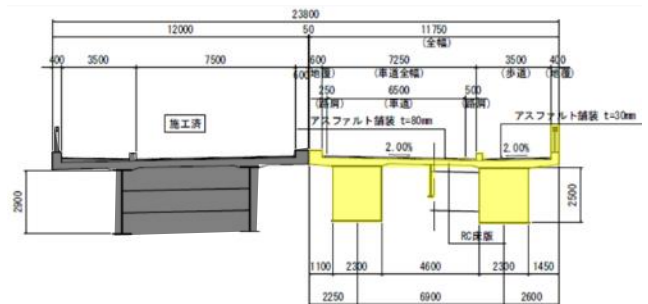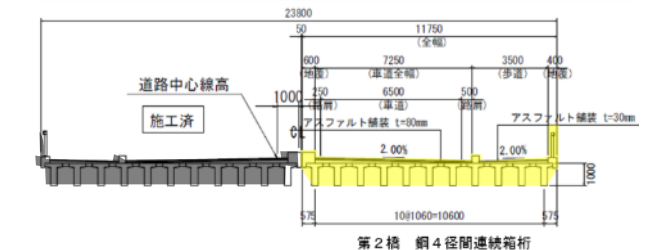

第2橋

第1橋

至小諸

千曲川

至葦崎

浅夢大橋
R元年9月25日撮影



至葦崎

浅蓼大橋
R元年9月25日撮影
