

【施設効果事例】 縦の木川砂防堰堤(長野県上伊那郡箕輪町富田)

災害発生日：令和3年8月15日(推定)

降雨状況：連続雨量319mm(8月12日22時～15日11時)
時間最大雨量25mm(8月15日3時～4時)
※上古田雨量観測所

発生箇所：長野県上伊那郡箕輪町富田


崩壊状況：土石流捕捉量 約2,000m³(推定値)

状況：令和3年8月13日からの大雨に伴う降雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。


位置図



全景

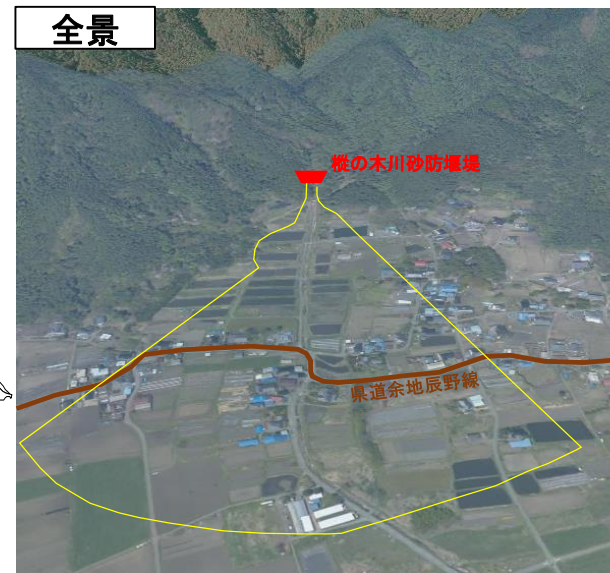

土石流発生前 (H31.3.20撮影)



土石流発生後 (R3.8.27撮影)

