


番号	6	事業名	県営林道開設	市町村名	飯田市	路河川名	矢筈線	箇所名(ふりがな)	矢筈(やはず)
----	---	-----	--------	------	-----	------	-----	-----------	---------

### 当初標準断面図

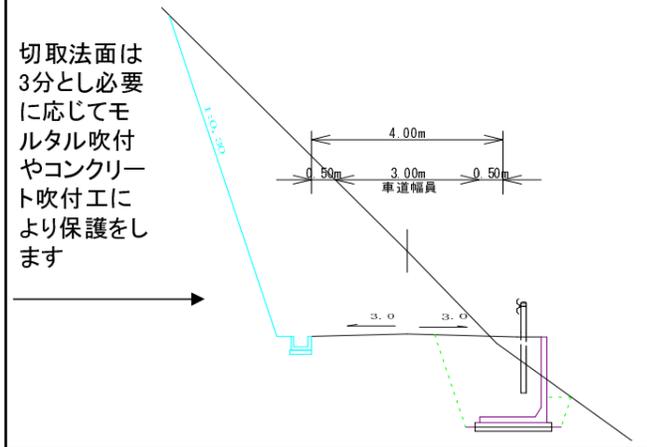

### 開設単価増加について

当初計画時の切土勾配は岩盤は3分勾配の設計であったが、実施においては当初想定より岩盤の風化が進み、3分勾配では自立安定しない状況であったことから、6分又は8分の勾配に変更し法面保護工(風化防止、剥落防止、緑化工)を実施した。  
また、実施横断面のとおり切取時に崩壊が発生した箇所もあり、残土及び法面保護工が増大したため。





切取面の岩盤は風化が進んでおり3分勾配では自立安定しない状況。



### 実施横断面図抽出

#### 【H13横断面図】

6分、8分で切土を実施したが、上部の崩土の堆積した地質により拡大崩壊した。残土量増、法面保護工は法枠工に変更。

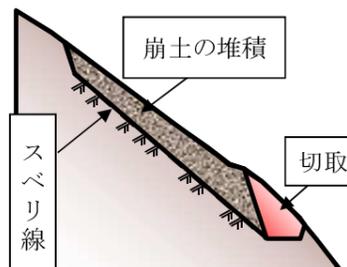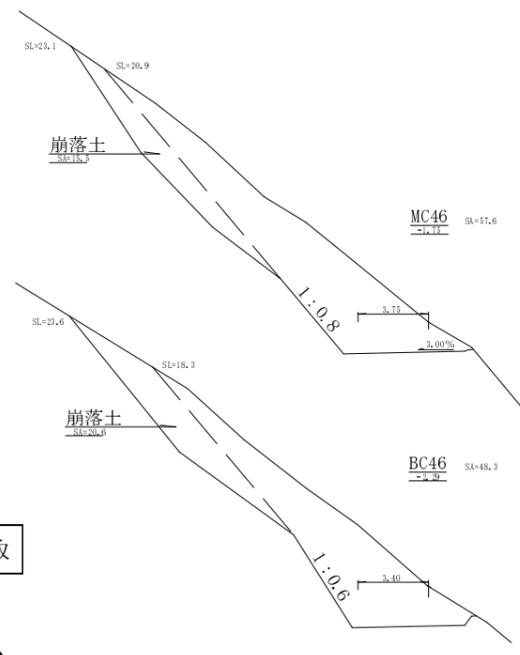

#### 【H19横断面図】

下部は3分の切取でも安定したが、上部の土質が悪く、土砂の部分が崩壊した。残土量増、コンクリート吹付面積増。

朱書: 変更  
コンクリート吹付面積増。

