# クリーンピア千曲の被災および現在の状況

○堤防の決壊により、千曲川流域下水道下流処理場が冠水。
　電気系統のショートを防ぐため、施設の電源停止（処理停止）。

○10/24（木）より、流入下水を沈殿及び塩素消毒による簡易的な処理を開始。

○11/29（金）より、5つある水処理系列のうち、1つの系列において沈殿、消毒に加え簡易的な生物処理の実施を開始。
　12/16（月）より、もう1系列を復旧させ2系列で簡易的な生物処理を実施。

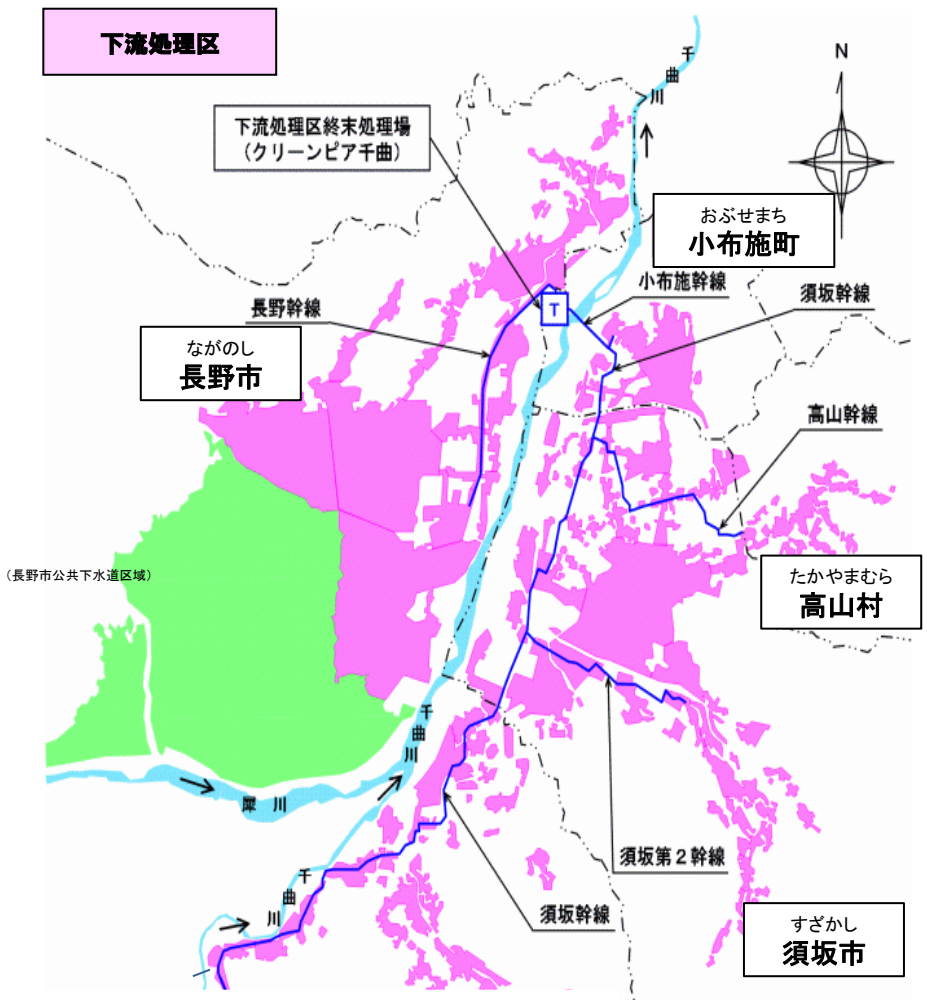


クリーンピア千曲における水処理状況（R1.12.16～）

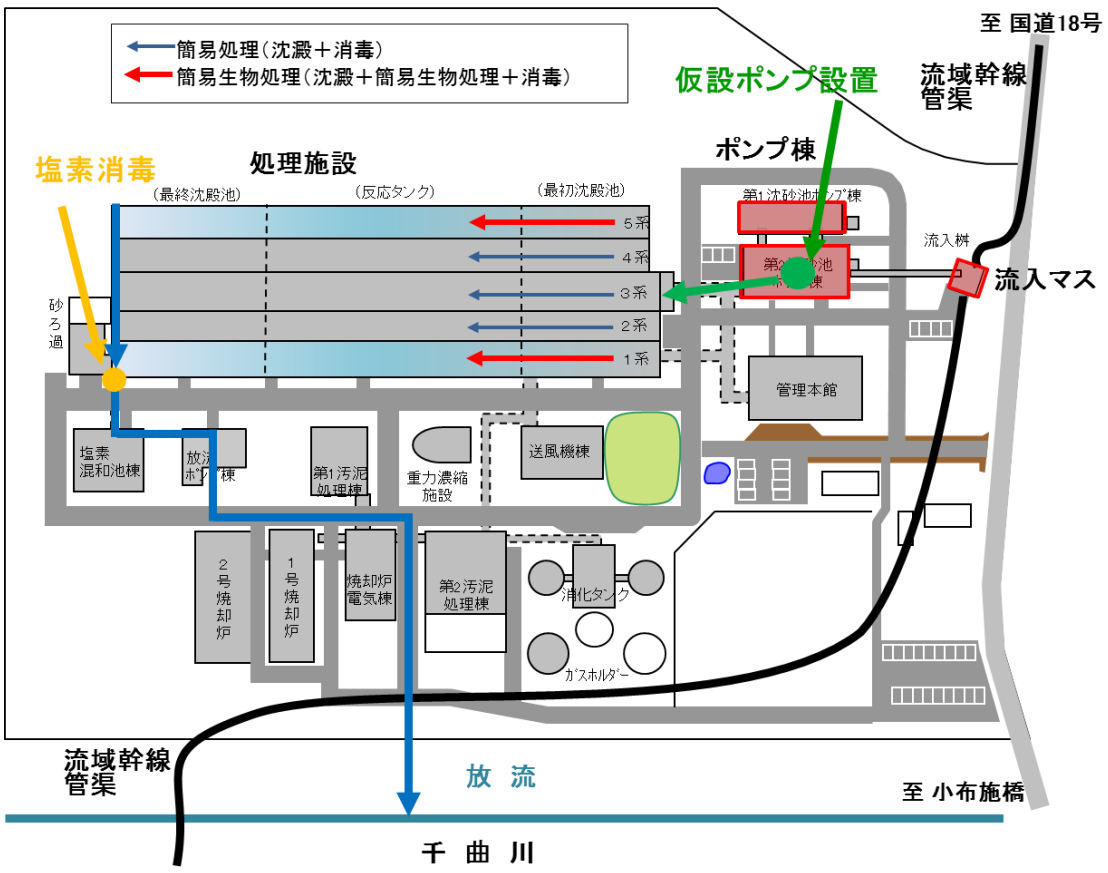

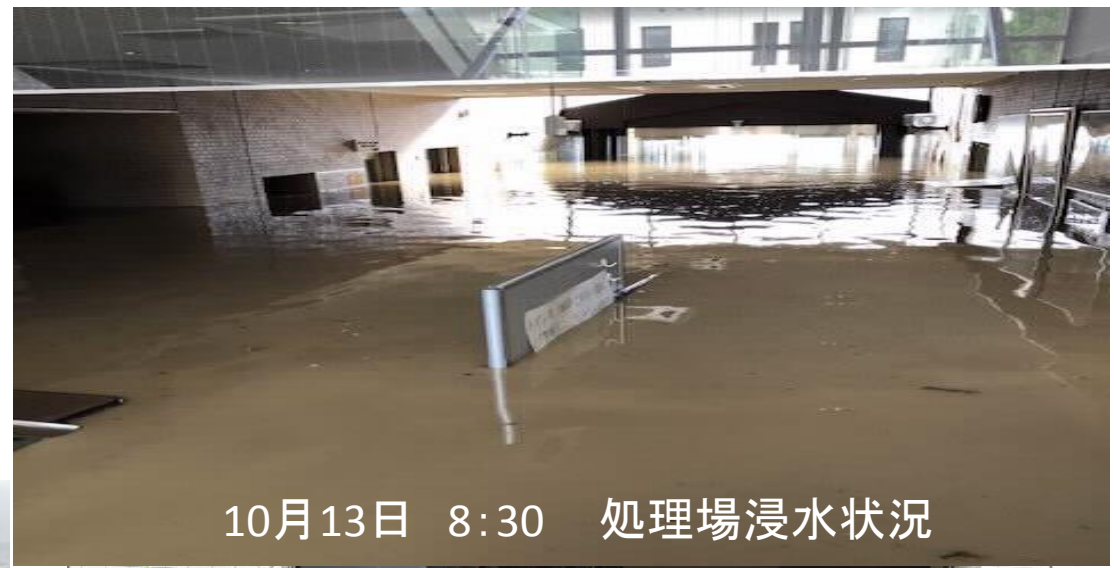

10月13日　8:30　処理場浸水状況

10月21日　仮設ポンプ設置状況
