

平成28年度

森林税活用事業
の概要と進捗状況

平成28年度 長野県森林づくり県民税活用事業の体系

(単位:千円、%)

使途	事業名	事業内容	平成28年度 予算額	平成27年度 当初予算	前年度比	
1	継	みんなで支える 里山整備事業(間伐経費分)	小規模・分散的な手入れの遅れた集落周辺の里山の森林を中心に、間伐を面的に推進 [間伐面積目標:2,500ha]	計 675,480 国 311,730 税 363,750	計 842,840 国 409,110 税 433,730	80.1 76.2 83.9
	継	地域で進める 里山集約化事業	地域が主体となった里山整備計画の樹立、森林整備や間伐材搬出に係る森林所有者の同意を得る活動等を支援 [集約化目標面積:450ha]	7,200	32,000	22.5
	継	森林づくり推進支援金	市町村が行う長野県森林づくり指針に掲げる施策の趣旨に即したきめ細かな森林づくりの取組を支援	130,000	130,000	100.0
	継	水源林公有林化 支援事業	市町村等が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、土地等の取得が必要となった場合の取得経費等を支援	(579)	(10,800)	5.4
	求められる機能に応じた 里山等の森林づくりの推進		小計	計 812,680 国 311,730 税 500,950	計 1,004,840 国 409,110 税 595,730	80.9 76.2 84.1
2	継	みんなで支える 里山整備事業(搬出経費分)	本事業による間伐材が県内で加工・消費が可能な場合、山土場までの搬出集積を支援 [搬出材積目標:4,200m ³]	14,700	14,000	105.0
	継	信州の木活用 モデル地域支援事業	里山の森林資源を供給から消費まで地域が一体となって様々な用途に利活用する先進的な取組を支援 [モデル地域への支援:5地域]	12,500	20,000	62.5
	拡	信州フォレストコンダクター 活動支援事業	信州フォレストコンダクターが各地域の林業・木材産業を経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮するための活動基盤づくりの取組を支援	1,158	4,581	25.3
間伐材の利活用等による 継続的な森林づくりの推進		小計	28,358	38,581	73.5	
3	継	みんなで支える 森林づくり推進事業	第三者機関による森林税活用事業の成果の検証、各種広報媒体を活用した森林税の広報・普及啓発活動を実施	9,017	9,251	97.5
	継	森林(もりの)里親促進事業	荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘発し、森林整備と交流を通じた新しい森林づくりと地域活性化を促進	1,240	1,240	100.0
	継	地球温暖化防止 吸収源対策推進事業	森林の里親促進事業により環境先進企業等が整備した森林のCO2吸収量を、委員会が審査して認証	434	433	100.2
	継	地球温暖化防止 木材利用普及啓発事業	県産材住宅の施主や事務所・店舗を木質化した企業等に対し、県産材利用によるCO2固定量を、委員会が審査して認証	552	503	109.7
	継	木育推進事業	県産材等を利用して県民が参加しながら木や森林について学習する「木育」活動を推進	10,236	9,860	103.8
	継	里山活用推進リーダー育成事業	林業技術等を有する林業研究グループ等が地域に働きかけ、技術指導や安全教育等を実施する中で、里山資源の利活用の推進と継続的に里山資源を活用した活動ができる地域づくりの取組を支援	3,000	3,000	100.0
里山と人との絆づくりを 進める取組の支援		小計	24,479	24,287	100.8	
合 計			計 865,517 国 311,730 税 553,787	計 1,067,708 国 409,110 税 658,598	81.1 76.2 84.1	

森林づくり 県民税基金 繰入額	個人県民税	534,735	536,596	99.7
	法人県民税	124,835	124,517	100.3
	利子・寄付金	79	278	28.4
	税金等小計	659,649	661,391	99.7
	前年度からの基金残高	109,929	107,136	102.6
	合計	769,578	768,527	100.1
当年度末の基金残高		215,791	109,929	196.3

長野県森林づくり県民税活用事業 (みんなで支える森林づくり事業)

平成28年度 事業進捗状況 (8月末見込)

資料 No.	事業名	H28予算額 [森林税基金分] (千円)	8 月 末 進 捗 率 (%)	進捗に関するコメント
1-①	みんなで支える里山整備事業 【間伐支援】	675,480 [363,750]	27%	順調に進んでいます。(第2回申請分(6月30日期限)までは内報済み。第3回申請分(8月20日期限)は内報準備中。)
1-②	地域で進める里山集約化事業	7,200 [7,200]	23%	順調に進んでいます。(計画の約半量の面積で計画承認済み)
1-③	森林づくり推進支援金	130,000 [130,000]	15%	順調に進んでいます。(市町村への交付決定が約6割完了)
1-④	【1-③ 森林づくり推進支援金のうち】 水源林公有林化支援事業	579 [579]	20%	順調に進んでいます。(地方事務所から市町村への交付決定を経て、現在市町村で事業実施中。)
2-①	みんなで支える里山整備事業 【搬出支援】	14,700 [14,700]	19%	順調に進んでいます。(第2回申請分(6月30日期限)までは内報済み。第3回申請分(8月20日期限)は内報準備中。)
2-②	信州の木活用モデル地域支援事業	12,500 [12,500]	40%	順調に進んでいます。(5地区を選定し6月上旬に内示。該当地方事務所において4件交付決定済み。)
2-③	信州フォレストコンダクター活動支援事業	1,158 [1,158]	10%	各地方事務所を通じてSFCに対して事業計画書の作成を依頼し、計画案の内容を審査中。
3-①	みんなで支える森林づくり推進事業	9,017 [9,017]		
3-①-1	広報・普及啓発費	4,679 [4,679]	26%	順調に進んでいます。各イベントでのリーフレットの配布による普及啓発、各地域での広報を展開中。
3-①-2	県民会議・地域会議開催費	4,338 [4,338]	19%	順調に進んでいます。(8月末時点では5地域のみ開催だが、上半期で県民会議及び半数の地域会議で会議を1回開催見込み。)
3-②	森林(もり)の里親促進事業	1,240 [1,240]	15%	順調に進んでいます。(3件の契約確保:10月までの契約。年間目標8件)(銀座NAGANOで講座開催:7月)
3-③	地球温暖化防止吸収源対策推進事業	434 [434]	20%	順調に進んでいます。(7月に審査委員会を1回開催しました。10月には第2回審査委員会を予定しています。)
3-④	地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	552 [552]	35%	順調に進んでいます。(普及活動実施中、CO2固定量は目標値1000t-CO ₂ に対し約450t-CO ₂ 認定予定)
3-⑤	木育推進事業	10,236 [10,236]	35%	順調に進んでいます。(事業主体の約8割に対し、事業計画が適である旨、通知済み)
3-⑥	里山活用推進リーダー育成事業	3,000 [3,000]	10%	3箇所の計画承認済み。うち2箇所について交付決定済みで事業を実施中。その他の箇所の計画書作成については調整中。
計	13事業	865,517 [553,787]		

1-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の里山等の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	補助率	予算額
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	2,500 ha	9/10以内	675,480 千円 [363,750 千円]

※ 予算額には平成27年度からの繰越額38,783千円を含まない。

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額 (確定見込含む)	8月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請					198,379千円	27%

(間伐実施見込みベース)

3 地方事務所別実施状況

区分	内報済み額(8月末)		8月末までの完了分		備考
	面積 (ha)	補助金額(千円)	面積 (ha)	補助金額(千円)	
佐久	41	9,100	41	9,100	
上小	99	29,324	99	29,324	
諏訪	13	3,558	13	3,558	
上伊那	113	30,010	113	30,010	
下伊那	207	63,570	207	63,570	
木曾	21	6,743	21	6,743	
松本	38	14,391	38	14,391	
北安曇	—	—	—	—	
長野	145	41,684	145	41,684	
北信	—	—	—	—	
計	677	198,379	677	198,379	現地での間伐完了分

※ 内報済み額及び補助金額の一部に、平成27年度からの繰越分を含む。

1-② 地域で進める里山集約化事業

1 事業の概要

(1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	450ha	15,000 ~30,000円 円/ha	7,200千円

* 1ha当たりの施業同意人数
 5人未満: 15,000円/ha
 5人以上10人未満: 24,000円/ha
 10人以上: 30,000円/ha

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												内示済面積	8月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	内示	(内示)				(内示)	(内示)					428.4 ha	23%
	← 交付申請 →												
	← 集約化活動 →												

3 地方事務所別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久	1	1	10.0	10.0	150.0	0.0	0.0	
上小								
諏訪	4	7	111.0	111.0	1,665.0	0.0	0.0	
上伊那	3	3	55.0	85.4	1,281.0	85.4	1,281.0	
下伊那	6	9	137.0	137.0	2,055.0	122.0	1,830.0	
木曾	5	5	65.0	65.0	975.0	0.0	0.0	
松本	1	1	10.0	10.0	150.0	0.0	0.0	
北安曇								
長野	1	1	20.0	10.0	150.0	0.0	0.0	
北信								
計	21	27	408.0	428.4	6,426.0	207.4	3,111.0	

1-③ 森林づくり推進支援金

1 事業の概要

(1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に関する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に関する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に関する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

※予算額の一部は、「水源林公有林化支援事業」に活用

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額 【予算配分額】	8月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
		配分	← 選定 →										78,415千円 【129,421千円】	15%
		← 事前着手 →						事業実施						

3 地方事務所別実施状況

区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	備考
				①市町村独自の森林整備嵩上げ補助、②森林病害虫対策、③景観形成に資する森林整備、④水源林取得経費支援等	①公共施設、学校等への木製品、木製遊具等の導入、②木質バイオエスの利活用取組、③搬出間伐を推進する取組等	①広域的な効果が見込める環境教育、②森林づくり活動等への支援、③野生鳥獣被害対策等		
佐久	7,885	8,970	16,855	0	0	0	0	
上小	4,388	9,493	13,881	8,473	2,326	1,393	12,192	
諏訪	5,301	3,408	8,709	580	0	0	580	
上伊那	6,387	6,438	12,825	0	0	0	0	
下伊那	9,883	9,527	19,410	12,387	4,093	2,930	19,410	
木曾	3,752	4,958	8,710	0	0	0	0	
松本	9,128	10,064	19,192	13,411	1,462	4,050	18,923	
北安曇	3,614	2,516	6,130	2,456	1,179	1,617	5,252	
長野	10,518	7,027	17,545	8,801	2,288	6,456	17,545	
北信	4,144	2,020	6,164	1,313	595	2,605	4,513	
計	65,000	64,421	129,421	47,421	11,943	19,051	78,415	

1-④ 水源林公有林化支援事業 (森林づくり推進支援金)

1 事業の概要

(1) 目的

市町村が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、やむを得ず土地等(土地及び立木又は立木のみ)の取得が必要となった場合に支援し、水源林の保全を図る。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
市町村が水源林を公有林化するために取得する森林の土地代及び立木代等に対して補助する。	市町村	1/3以内	579千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												8月末 進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
要望調査 →			← 朝日村 事業実施									20%

3 地方事務所別実施状況

区分	市町村名	要 望			実施状況(実施予定)		
		面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)	面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)
佐久							
上小							
諏訪							
上伊那							
下伊那							
木曾							
松本	朝日村	0.6	1,736	578	(0.6)	(1,736)	(578)
北安曇							
長野							
北信							
計	1村	0.6	1,736	578	(0.6)	(1,736)	(578)

2-① みんなで支える里山整備事業(搬出支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで切り捨てられていた間伐材の利活用を進めるため、みんなで支える里山整備事業で保育間伐を実施した森林から間伐材を搬出する取組みを支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画材積	補助率	予算額
この事業で伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業で、県内での加工又は消費が確実なもの	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	4,200 m ³	定額 [3,500 円/m ³]	14,700 千円

2 スケジュール及び進捗状況

補助金交付申請スケジュール												補助金確定額	8月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
第1回申請		第2回申請		第3回申請		第4回申請		第5回申請					2,723千円	19%

(現地での搬出完了(見込み)ベース)

3 地方事務所別実施状況

区分	配当済み額(8月末)		完了済み(8月末)		備考
	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	搬出材積 (m ³)	補助金額(千円)	
佐久	0	0.0	0	0	
上小	0	0.0	0	0	
諏訪	0	0.0	0	0	
上伊那	484	1,694.0	484	1,694	
下伊那	285	997.5	285	998	
木曾	9	31.5	9	32	
松本	0	0.0	0	0	
北安曇	0	0.0	0	0	
長野	0	0.0	0	0	
北信	0	0.0	0	0	
計	778	2,723.0	778.0	2,723.0	現地での搬出完了分

2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

1 事業の概要

(1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的団体、林業関係団体、NPO法人等	10/10以内	12,500
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
対象事業の公募	←→												40%
対象事業の審査・決定		←→											
事業の実施			←→										

3 地方事務所別事業採択状況

区分	木質バイオマスモデル		街並みづくりモデル		道の駅等販売モデル		合計	
	件数	要望額(千円)	件数	要望額(千円)	件数	要望費(千円)	件数	要望額(千円)
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-
上小	-	-	-	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-
上伊那	-	-	1	2,500	-	-	1	2,500
下伊那	-	-	-	-	-	-	-	-
木曾	-	-	-	-	2	5,000	2	5,000
松本	-	-	-	-	-	-	-	-
北安曇	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
長野	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500
北信	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	1	2,500	4	10,000	5	12,500

一部新 信州フォレストコンダクター活動支援事業

(旧 信州フォレストコンダクター育成事業)

信州の木活用課

1 趣 旨

「信州フォレストコンダクター」(以下、「SFC」という。)が、各地域の林業・木材産業を、経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮していくために、県と連携して行う活動基盤づくりの取組を支援する。

2 現状と課題

- 平成25年度から27年度に実施した「信州フォレストコンダクター育成事業」で育成された30名のSFCが、各地域で木材の需要拡大や利活用推進の取組を始めている。
- 一方で、森林組合や林業事業体の一職員という立場であるSFCが、地域の林業・木材産業関係者と連携して円滑に活動するためには、当面の間は公的な立場である県が密接に連携してSFCと地域の関係者の仲立ちを行い、その活動の基盤づくりを支援することが必要。

3 事業主体 県

4 予算要求額 1,158千円 (基金繰入金1,158千円)

5 事業内容

事業区分	事業内容	H28予算要求額 (千円)	H27予算額 (千円)
SFC 地域活動 支援	SFCと県の林業普及指導員等が連携して行う、SFCの活動基盤づくりの取組を支援する。 (例)▶地域の関係者に対する研修会等の実施 ▶SFCの活動地域が参考にすべき先進地の視察 等	947	—
SFC 連携会議 の開催	県下の全SFCと、県の林業普及指導員等が一堂に会し、各地域における活動状況の報告や、SFCの連携等について情報共有や意見交換を行う連携会議を開催する。	211	331
個別研修 集合研修	各林業事業体に県が委託して行う個別研修及び県が実施する集合研修によりSFCを育成する。	—	4,250
計		1,158	4,581

※主な増減理由

- SFC育成個別研修・集合研修のメニュー廃止による減
- SFC地域活動支援のメニュー新設による増
- SFC連携会議開催費用の見直しに伴う減

6 事業目標

- 育成された全てのSFCが、県と連携した活動基盤づくりの取組を実施し、各地域の素材生産量・出荷量の増大を図ることで、県全体の素材生産量の目標達成に資する。

※数値目標：活動基盤づくりの取組の実施回数…10回/年 (各地域で1回/年)

- 当該事業による支援終了後は、各地域のSFCが連携しつつ、地域の林業・木材産業関係者をとりまとめ、県に頼らず自発的な活動を行う。

2-③ 信州フォレストコンダクター活動支援事業 (旧 信州フォレストコンダクター育成事業)

1 事業の概要

(1) 目的

「信州フォレストコンダクター」(以下、「SFC」という。)が、各地域の林業・木材産業を経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮し、関係者と連携して円滑に活動を展開していくために、県が密接に連携しながら行う活動基盤づくりの取組を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額 (千円)
SFC 地域活動支援	SFCと県の林業普及指導員等が連携して行う、SFCの活動基盤づくりの取組を支援する。 (例)▶地域の林業・木材関係者に対する研修会等の実施 ▶SFCの活動地域が参考にすべき先進地の視察 等	県	947
SFC 連携会議開催	県下の全SFCと県担当者が一堂に会し、各地域における活動状況の報告や、SFCの連携等について情報共有や意見交換を行う連携会議を開催する。		211
計			1,158

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末 進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
活動支援			← 事業計画 作成・審査 →				← 事業実施 →					↓ 実績 報告	10%
連携会議											○		

3 現在の実施状況

○6月中旬： 地方事務所に対し、SFCと調整して事業計画を作成するよう依頼

○8月下旬： 提出された事業計画書の内容を審査中

(参考)SFCの登録状況

地方事務所	人数	地方事務所	人数
佐久	4名	松本	3名
上小	2名	北安曇	2名
諏訪	2名	長野	4名
上伊那	3名	北信	3名
下伊那	2名	県域	1名
木曾	4名	合計	30名

※30名のうち、森林組合職員20名
民間の林業事業体職員9名
県域団体(長野県森林組合連合会)1名

3-①-1 広報・普及啓発費

1 事業の概要

(1) 目的

県民等に対し、長野県森林づくり県民税の仕組みや事業内容について周知を図るとともに、森林づくりに対する意識の醸成を図る。


(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
<ul style="list-style-type: none"> ・森林づくりレポートや各種広報活用による普及啓発 ・ラジオ番組、スポットCM等による普及啓発 ・普及啓発イベント及びシンポジウムの開催 ・森林税の見える化！の実施 	県	4,679千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
森林づくりレポート等普及啓発					←								→	10%
ホームページの更新	←												→	10%
シンポジウム等				◀			◀							50%
リーフレット	←	リーフレット作成											→	100%
ラジオ番組、スポットCM等							←		→					0%
森林税の見える化！			←										→	0%
計														26%


【リーフレット】

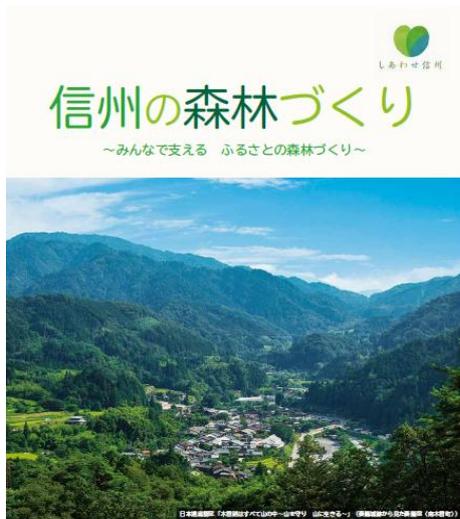

- 長野県森林づくり県民税を活用した取組 -



【森林づくりレポート】

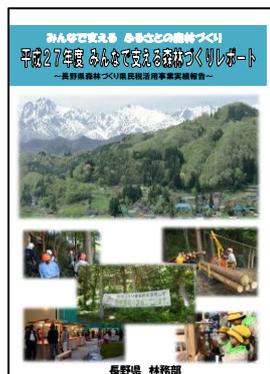

森林税の見える化！

森林税の仕組みや使い道等を県民に普及啓発する地域ごとの取組

ラジオ番組とCMを組み合わせて普及啓発

各種イベントでのパネル等展示による普及啓発

リーフレットを作成し、全国植樹祭や第1回「山の日」記念全国大会等で配布し、県内外へ森林税のPRを行う。

3-①-2 県民会議・地域会議開催費

1 事業の概要

(1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,338千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議						●				●			●	0%
地域会議				← 2~3回開催 →									21%	
計														19%

3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況 (回)			次回開催予定	
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	NPOボランティア等	公募	森林所有者	設計士 木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数	残計画		
県民会議	3	2	1	1	1	2	2			1	13	3	0	3	9月	
地域 会議	佐久		1		1	2	1			1	7	3	0	3	9月	
	上小		1	1	1	1			1	1	8	2	0	2	10月	
	諏訪		1			1			1	1	3	7	2	1	1	3月
	上伊那	1	1	1	1	1	2		1	2	10	3	1	2	10月	
	南信州		1	1	1	1			1	3	8	2	1	1	3月	
	木曾		1			1	3		1	1	7	2	1	1	2月	
	松本	1	1	1	1	2	1			1	8	3	0	3	10月	
	大北		1	1	1	1	1			1	7	2	0	2	11月	
	長野		1	1	1	2	1		1	2	9	2	0	2	11月	
北信		1			2	1	1			2	7	2	1	1	2月	
計	5	12	7	8	15	13	3	6	13	9	91	26	5	21		

※ 大北地域については、現在委員の選定中であることから、委員構成については見込みを記載。

取組状況写真



H28雨氷害跡地の整備 社員約60名参加
【積水樹脂プラメタル(株)と辰野町】 (平成28年4月実施)



【内容】3日間の森林奉仕合宿(2年生320名)により、全国植樹祭の準備作業(整地・植栽目印地他)及び信州大学生との意見交換会(森林を守るには?木材を利用するには?)などを実施



高校生による森林整備及び森林学習等
【都立北園高校と西春近自治協議会】 (平成28年5月実施)

【都立北園高校】

確かな学力とタフな人間力の育成をめざし、独自の「信州北園プロジェクト」を2011年から実施。「総合的な学習の時間」の中で環境教育を推進。昨年度は過去最高の進学実績となる。進学校。

3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO₂吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO ₂ 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO ₂ の評価・認証を行う	県	434千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
認証申請						申請期間				申請期間			20%
評価・認証													
審査委員会				第1回			第2回					第3回	

3 現在の実施状況

- 平成28年4～7月 昨年度改正したCO₂吸収量認証制度を企業等に広報
- 平成28年7月21日 平成28年度 第1回の審査委員会を長野市で開催し、改正したCO₂吸収量認証制度について、企業等へのPR方法、地事担当者との連携強化を検討。
- 平成28年8月以降 CO₂認証制度を企業等にPRし、認証評価の営業を実施。
- 平成28年10月 平成28年度第2回の審査委員会(現地調査等)を9～10月に申請の地事管内で実施予定。

3-⑤ 木育推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	木工教室や県内小中学生を対象とした木工工作コンクールの支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	9,025
木育推進員の派遣	各地域での木育活動への指導員の派遣	県(地方事務所)	—	450
その他	原材料等の購入	県	—	61
計				10,236

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
木育県域活動支援		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	35%
木育地域活動支援	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
木育推進員の派遣	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
その他				←	←	←	←	←	←	←	←		

3 地方事務所別実施状況(木育地域活動支援分)

地事名	計画承認		地事名	計画承認		地事名	計画承認	
	件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)
佐久	0	0	下伊那	10	1,761	長野	0	0
上小	3	900	木曾	-	-	北信	4	1,621
諏訪	4	606	松本	2	500	計	31	7,173
上伊那	7	1,285	北安曇	1	500			

3-⑥ 里山活用推進リーダー育成事業

1 事業の概要

(1) 目的

林業技術を有する林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等が、地域に働きかけ、技術指導や安全教育を実施する中で地域リーダーを育成し、里山資源の利活用の推進と継続的に活動できる地域づくりを推進する。

(2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
地域のグラント・デザインの提案	地域協議会の組織化、グラント・デザインの提案・作成に関する活動	林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等	10/10以内 (1箇所30万円を上限)	3,000千円
里山整備及び資源の活用	里山の健全化に向けた森林整備等にかかる指導及び山菜等の栽培や薪などの生産に関する指導			
地域リーダーの育成	地域の課題に対する講習会、先進地への視察等に関する活動			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												8月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
事業の実施			計画書提出・承認				計画書提出承認		事業実施			完了		10%

3 現在の実施状況

- 6月上旬に事業計画書提出(3事業)
上小林業士会(上小)、松本林業士会(松本)、高水林業協議会(北信)
- 6月下旬 計画書の承認(上記3事業)
- 8月下旬時点 上記のうち2事業について交付決定済み
- 10月上旬までに事業計画書提出(未提出事務所)
- 10月下旬 計画書の承認予定(7事業)
